Project-plan-v1.0

για το έργο **Hair-ointment**



Μέλη ομάδας:

Κωνσταντίνος Τσιαμήτρος ή έτος σπουδών ΑΜ: 5913

Κωνσταντίνος Μπότσης ΄Ζ έτος σπουδών ΑΜ: 1044399

Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος Έ έτος σπουδών ΑΜ: 1054384

Σπυρίδων Γεωργιόπουλος Έ έτος σπουδών ΑΜ: 1054383

Ρόλοι μελών ομάδας:

Editor: Τσιαμήτρος Κωνσταντίνος Contributor: Γεωργιόπουλος Σπυρίδων

Εργαλεία:

Τα σχήματα έγιναν με τη χρήση του προγράμματος excel και η συγγραφή του τεχνικού κειμένου με τη χρήση του Google Docs.

Τελική έκδοση του project-plan-v1.0


Η τελική έκδοση είναι ανανεωμένη έκδοση της έκδοσης ν0.2 χρησιμοποιήθηκε καινούριο πιο εύκολο στη χρήση template για τα διαγράμματα gantt και διαπιστώσαμε ότι είχαμε κάνει λάθος στην προσέγγιση μας για το project plan οπότε και αλλάξαμε τα υποέργα.

Project plan- τυπικά υποέργα(tasks)


TY1	Ανάλυση μελών
TY2	Δημιουργία logo,mockup screens,brainstorming
TY3	Ανάλυση έργου και τύπου χρηστών
TY4	Ανάλυση των εργαλείων του έργου
TY5	Ανάλυση UML διαγραμμάτων
TY6	Ανάλυση προδιαγραφών
TY7	Σχεδιασμός περιβάλλοντος διεπαφής χρήστη
TY8	Σχεδιασμός περιβάλλοντος διεπαφής διαχειριστή
TY9	Σχεδιασμός περιβάλλοντος διεπαφής ιδιοκτήτη καταστήματος
TY10	Σχεδιασμός υποσυστήματος αναζήτηση καταστημάτων.
TY11	Σχεδιασμός Υποσυστήματος επιλογών διαχειριστή
TY12	Σχεδιασμός βάσης δεδομένων
TY13	Ανάπτυξη περιβάλλοντος διαχειριστή.
TY14	Ανάπτυξη περιβάλλοντος χρήστη
TY15	Ανάπτυξη υποσυστήματος αναζήτησης καταστημάτων
TY16	Ανάπτυξη υποσυστήματος επιλογών χρήστη
TY17	Ανάπτυξη υποσυστήματος επιλογών διαχειριστή
TY18	Ανάπτυξη Βάσης δεδομένων
TY19	Ολοκλήρωση και έλεγχος
TY20	Αξιολόγηση από τους πελάτες
TY21	Τροποποιήσεις που πρότειναν αυτοί ή που κρίθηκαν απαραίτητες
TY22	Εγκατάσταση

Gantt Chart Έργου

Task	Start Date	Days to Complete
Task 1	01-Mar	3
Task 2	04-Mar	10
Task 3	14-Mar	8
Task 4	22-Mar	2
Task 5	22-Mar	20
Task 6	12-Apr	8
Task 7	20-Apr	15
Task 8	05-May	5
Task 9	20-Apr	10
Task 10	20-Apr	15
Task 11	05-May	5
Task 12	10-May	20
Task 13	01-Jun	10
Task 14	10-Jun	7
Task 15	01-Jun	12
Task 16	10-Jun	25
Task 17	17-Jun	10
Task 18	13-Jun	22
Task 19	06-Jul	8
Task 20	14-Jul	4
Task 21	18-Jul	5
Task 22	23-Jul	2

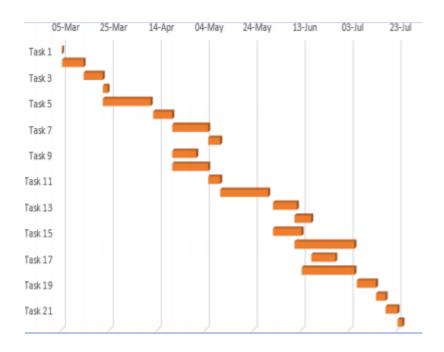

Pert chart

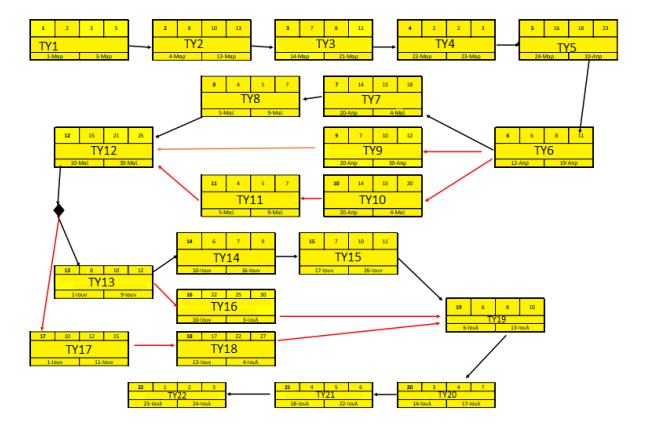

Το κρίσιμο μονοπάτι είναι 1-2-3-4-5-6-7-8-12-13-14-15-19-20-21-22 διάρκειας 144 ημερών.

Ως, **ορόσημο/milestone** χαρακτηρίζουμε το TY12 που χρειάζονται οι προγραμματιστές για να αναπτύξουν το σύστημα και να πάρουν τα δεδομένα για την υλοποίηση.

Διαχείριση προσωπικού έργου

Αντίστοιχα με τη παρακάτω σειρά:

Τσιαμήτρος, Σπυρόπουλος, Μπότσης, Γεωργιόπουλος



Εκτίμηση Κόστους

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ	
1.ΚΟΣΤΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	(4 άτομα) χ (5 μήνες εργασίας) χ 1000€ = 25.000€
2. ΕΜΜΕΣΑ ΚΟΣΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
ΤΥΠΟΣ ΕΜΜΕΣΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ	ΚΟΣΤΟΣ
Σχεδίαση γραφικών	1500€
Κόστος σχεδιασμού APIs	2000€
Πρόσθετο κόστος για reviews	1250€
Κόστος debugging	1000€
Σύνολο:25.000€ + 5750€ = 30.750€	30750€

Πηγές:

Διαφάνειες eclass του μαθήματος
